

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

*Общество с ограниченной ответственностью
«Наладочно-монтажное предприятие»
г. Щёлкино*

«Капитальный ремонт многофункционального
центра предоставления государственных
и муниципальных услуг,
расположенного по адресу: Республика Крым,
Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская,89»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПР626/06-20/№14
Перечень мероприятий
по охране окружающей среды

Директор

Главный инженер проекта



Г.В. Остах

С.А. Коляка

2020г.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Состав, содержание, порядок разработки раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» представлены в соответствии с требованиями:

–Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г., №87;

–Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации

«Охрана окружающей среды». «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, требованиями нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при проведении строительства и эксплуатации объектов различного назначения:

–Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02г. №7-ФЗ;

–Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96-ФЗ;

–Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ;

–Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01г. №136-ФЗ;

–Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ О животном мире; Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 г. N 200-ФЗ;

–Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. №52-ФЗ;

–Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. №89-ФЗ;

–Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-ФЗ;

–Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР626/06-20/№14

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89»

Изм. Колуч. Лист №док. Подп. Дата
Разработал Пчелинцева Е.А.
Проверил Пчелинцев Д.А.

**Перечень мероприятий
по охране окружающей среды**

Стадия Лист Листов
П 2 6

ГИП Коляка С.А.

Общие данные

ООО "НМП"

Основными задачами разработки раздела являются:

–определение степени воздействия объекта на окружающую среду посредством покомпонентного анализа на стадии строительства и эксплуатации;
–оценка возможного экологического ущерба при строительстве и эксплуатации объекта;
–разработка перечня мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Предлагаемые проектом технологические решения освещены далее в соответствующих разделах и обеспечивают строительство объекта с минимальным воздействием на окружающую природную среду и экологически безопасную эксплуатацию указанного объекта.

При проведении строительных работ на МФЦ г. Белогорск негативное воздействие на окружающую среду заключается в:

–различных формах нарушения земной поверхности;
–рельефообразования;
–загрязнении атмосферного воздуха выбросами вредных веществ при проведении СМР
–образовании отходов.

Для оценки воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей среды в разделе выявлены параметры техногенного влияния на окружающую среду, при этом определены:

–валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, как не существенные;
–количество образующихся при производстве работ отходов и размещение отходов определено как место временного содержания отходов с последующей транспортировкой их в пункты утилизации
Платы за негативное воздействие на окружающую среду в период СМР, если такие имеются, осуществляются Подрядной строительной организацией.

В период производства работ воздействие объекта на окружающую среду при соблюдении природоохранных мероприятий будет допустимым, устойчивость экосистем не будет нарушена.

Вывоз и утилизация отходов в период строительства.

Ответственность за временное размещение, вывоз и сдачу на захоронение или на утилизацию отходов, образовавшихся за время проведения предусмотренных проектом работ (за исключением металлолома, сдача которого на предприятия втормета осуществляется Заказчиком), несёт Подрядная организация в соответствии с действующим законодательством.

Площадки временного хранения отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей природной среды. В зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики отходов и их компонентов, отходы временно хранятся:

–в закрытой металлической емкости – огарки сварочных электродов;
–в контейнерах, установленных на участке проведения работ – отходы изоляционных материалов, сварочный шлак, твердые бытовые отходы;
–в закрытой металлической емкости – ветошь обтирочная замасленная;
–крупногабаритные отходы на площадке с уплотненным грунтом.

Места размещения образующихся в период строительства отходов определяет подрядная организация на основании заключаемых ею договоров. Места размещения отходов, в данном проекте носит рекомендательный характер:

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР626/06-20/№14

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегорская, 89»

**Перечень мероприятий
по охране окружающей среды**

Стадия	Лист	Листов
П	3	6

Общие данные

ООО "НМП"

–утилизация строительного мусора, твердых бытовых, производственных отходов предусматривается путем вывоза на полигон ТБО;

–утилизация лома черного и цветного металла осуществляется по договору купли-продажи с предприятиями вторчермета;

–вывоз жидких бытовых отходов осуществляется по договору подрядчика на очистные сооружения.

Перед началом работ по проекту подрядной организации необходимо заключить и представить договоры со специализированными предприятиями на прием планируемых к образованию отходов.

Предприятия, специализирующиеся на приеме отходов, должны представить лицензии на обращение с опасными отходами.

Период эксплуатации.

Ответственность за временное размещение, вывоз и сдачу на захоронение или на утилизацию отходов, образовавшихся в период эксплуатации несет МФЦ.

На территории МФЦ должны быть организованы площадки временного хранения отходов оборудованные таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей природной среды. В зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики отходов и их компонентов, отходы временно хранятся:

- в заводской упаковке и герметичной емкости в подсобном помещении удаленном от посторонних лиц – отработанные ртутные люминесцентные лампы;
- в закрытой металлической емкости – огарки сварочных электродов;
- в контейнерах, установленных на площадке МФЦ – малотоксичные отходы, твердые бытовые отходы;
- вывоз отходов I класса опасности должна осуществляться по договору на специализированное предприятие для утилизации;
- вывоз отходов III класса опасности должна осуществляться по договору на специализированное предприятие для дальнейшей переработки и утилизации;
- малотоксичные отходы должны вывозиться на захоронение на полигон ТБО имеющий лицензию;
- утилизация лома черного и цветного металла осуществляется по договору купли-продажи с предприятиями вторчермета;
- вывоз жидких бытовых отходов осуществляется, по договору, на очистные сооружения

Организация и санитарные требования к транспортировке отходов

Вывоз всех видов отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации осуществляется, как на полигон для захоронения, так и на предприятия по переработке, транспортом подрядной организации, с учетом требований санитарных норм, правил и инструкций по транспортировке отходов.

Вывоз и удаление опасных отходов может быть осуществлен лишь при следующих условиях:

- на транспортируемую партию отходов должны быть оформлены в установленном порядке паспорта отходов 1-4 класса опасности;
- мусоровывозящая техника должна быть оборудована и снабжена специальными знаками;
- при осуществлении работ по удалению отходов должны строго соблюдаться требования по безопасности к их вывозу;

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР626/06-20/№14

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89»

**Перечень мероприятий
по охране окружающей среды**

Стадия	Лист	Листов
П	4	6

Общие данные

ООО "НМП"

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потерь в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Воздействие на почвенно-растительный покров при проведении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту МФЦ в г. Белогорск определяется, как не существенное.


При осуществлении строительно-монтажных работ возможны следующие виды воздействия на растительный покров:

- 2) угнетение растений вследствие негативного химического воздействия загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе строительной техники, изоляционных, сварочных работах.

Источниками воздействия на растительный покров на этапе строительно-монтажных работ являются: –строительные и транспортные машины и механизмы;

- После завершения работ проводится благоустройство территории МФЦ. В границах кратковременного отвода земель проводится техническая и биологическая рекультивация.

Формат А4

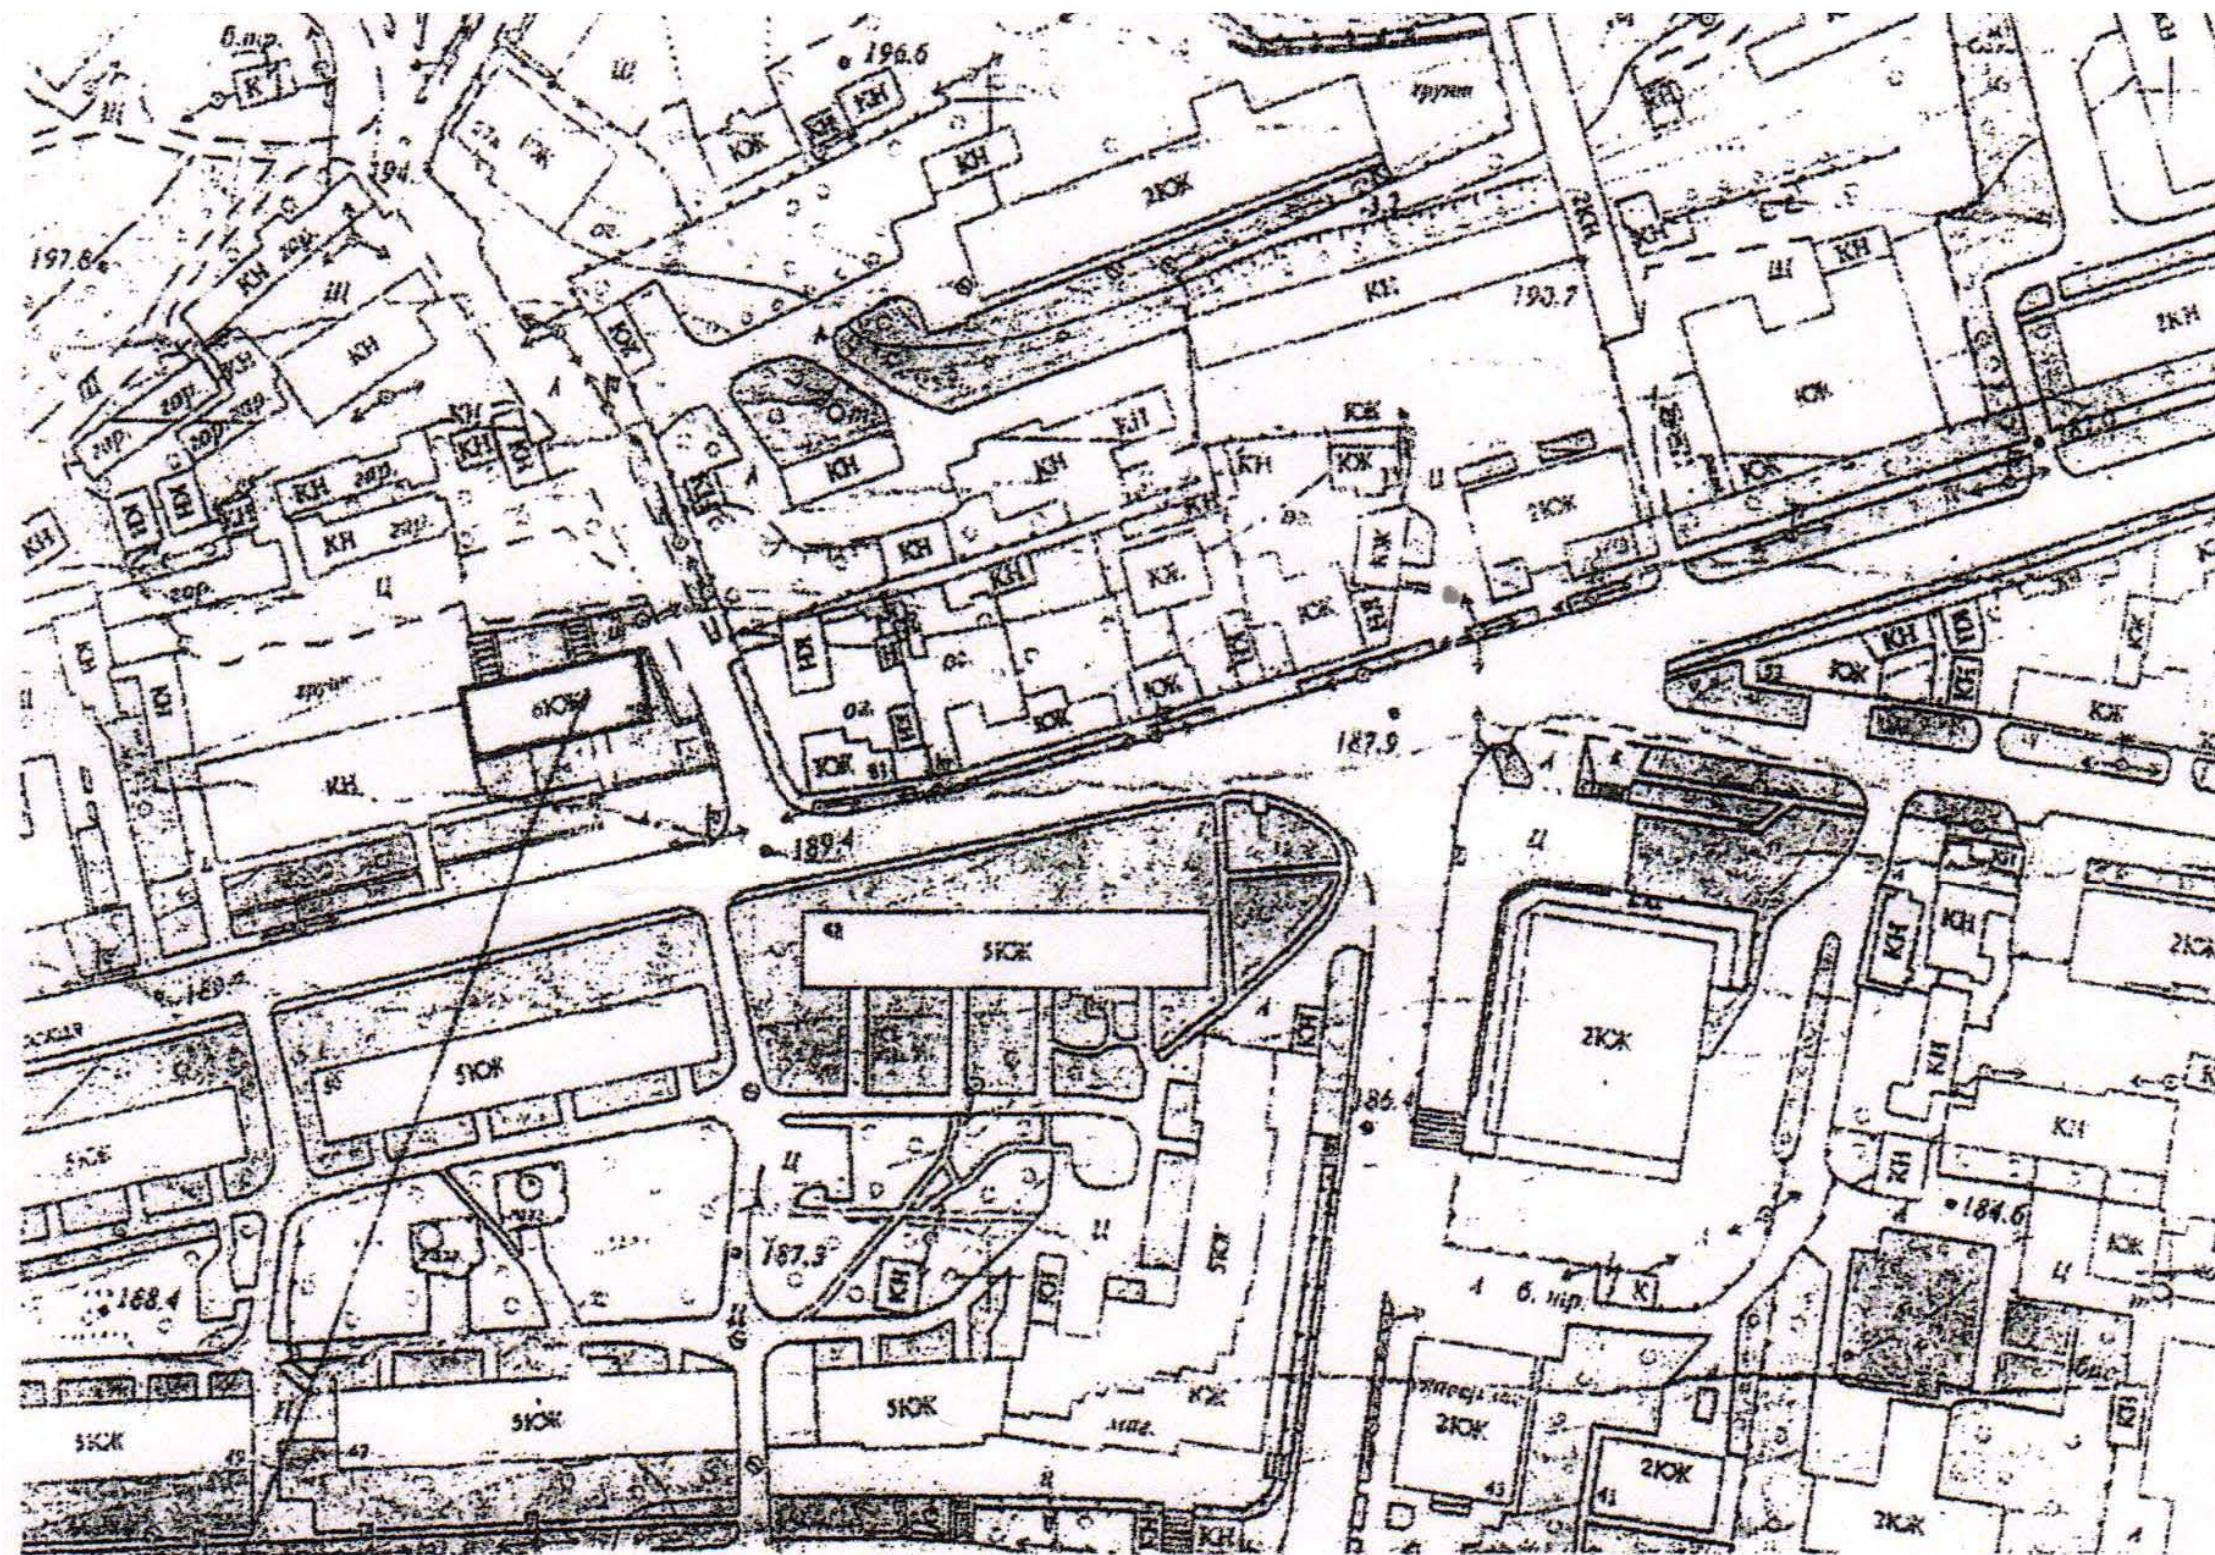

Место расположения здания капитального ремонта

Согласовано									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							

						ПР626/06-20/№14			
						«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская,89»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пчелинцева Е.А.						П	6	6
Проверил	Пчелинцев Д.А.								
ГИП	Коляка С.А.					Общие данные		ООО "НМП"	
